ARGE

Erschließung Trinkwasser Kaschwitz, Glaubnitz, Säuritz

Teil TrappInfra

Ablaufplan - Rev.0
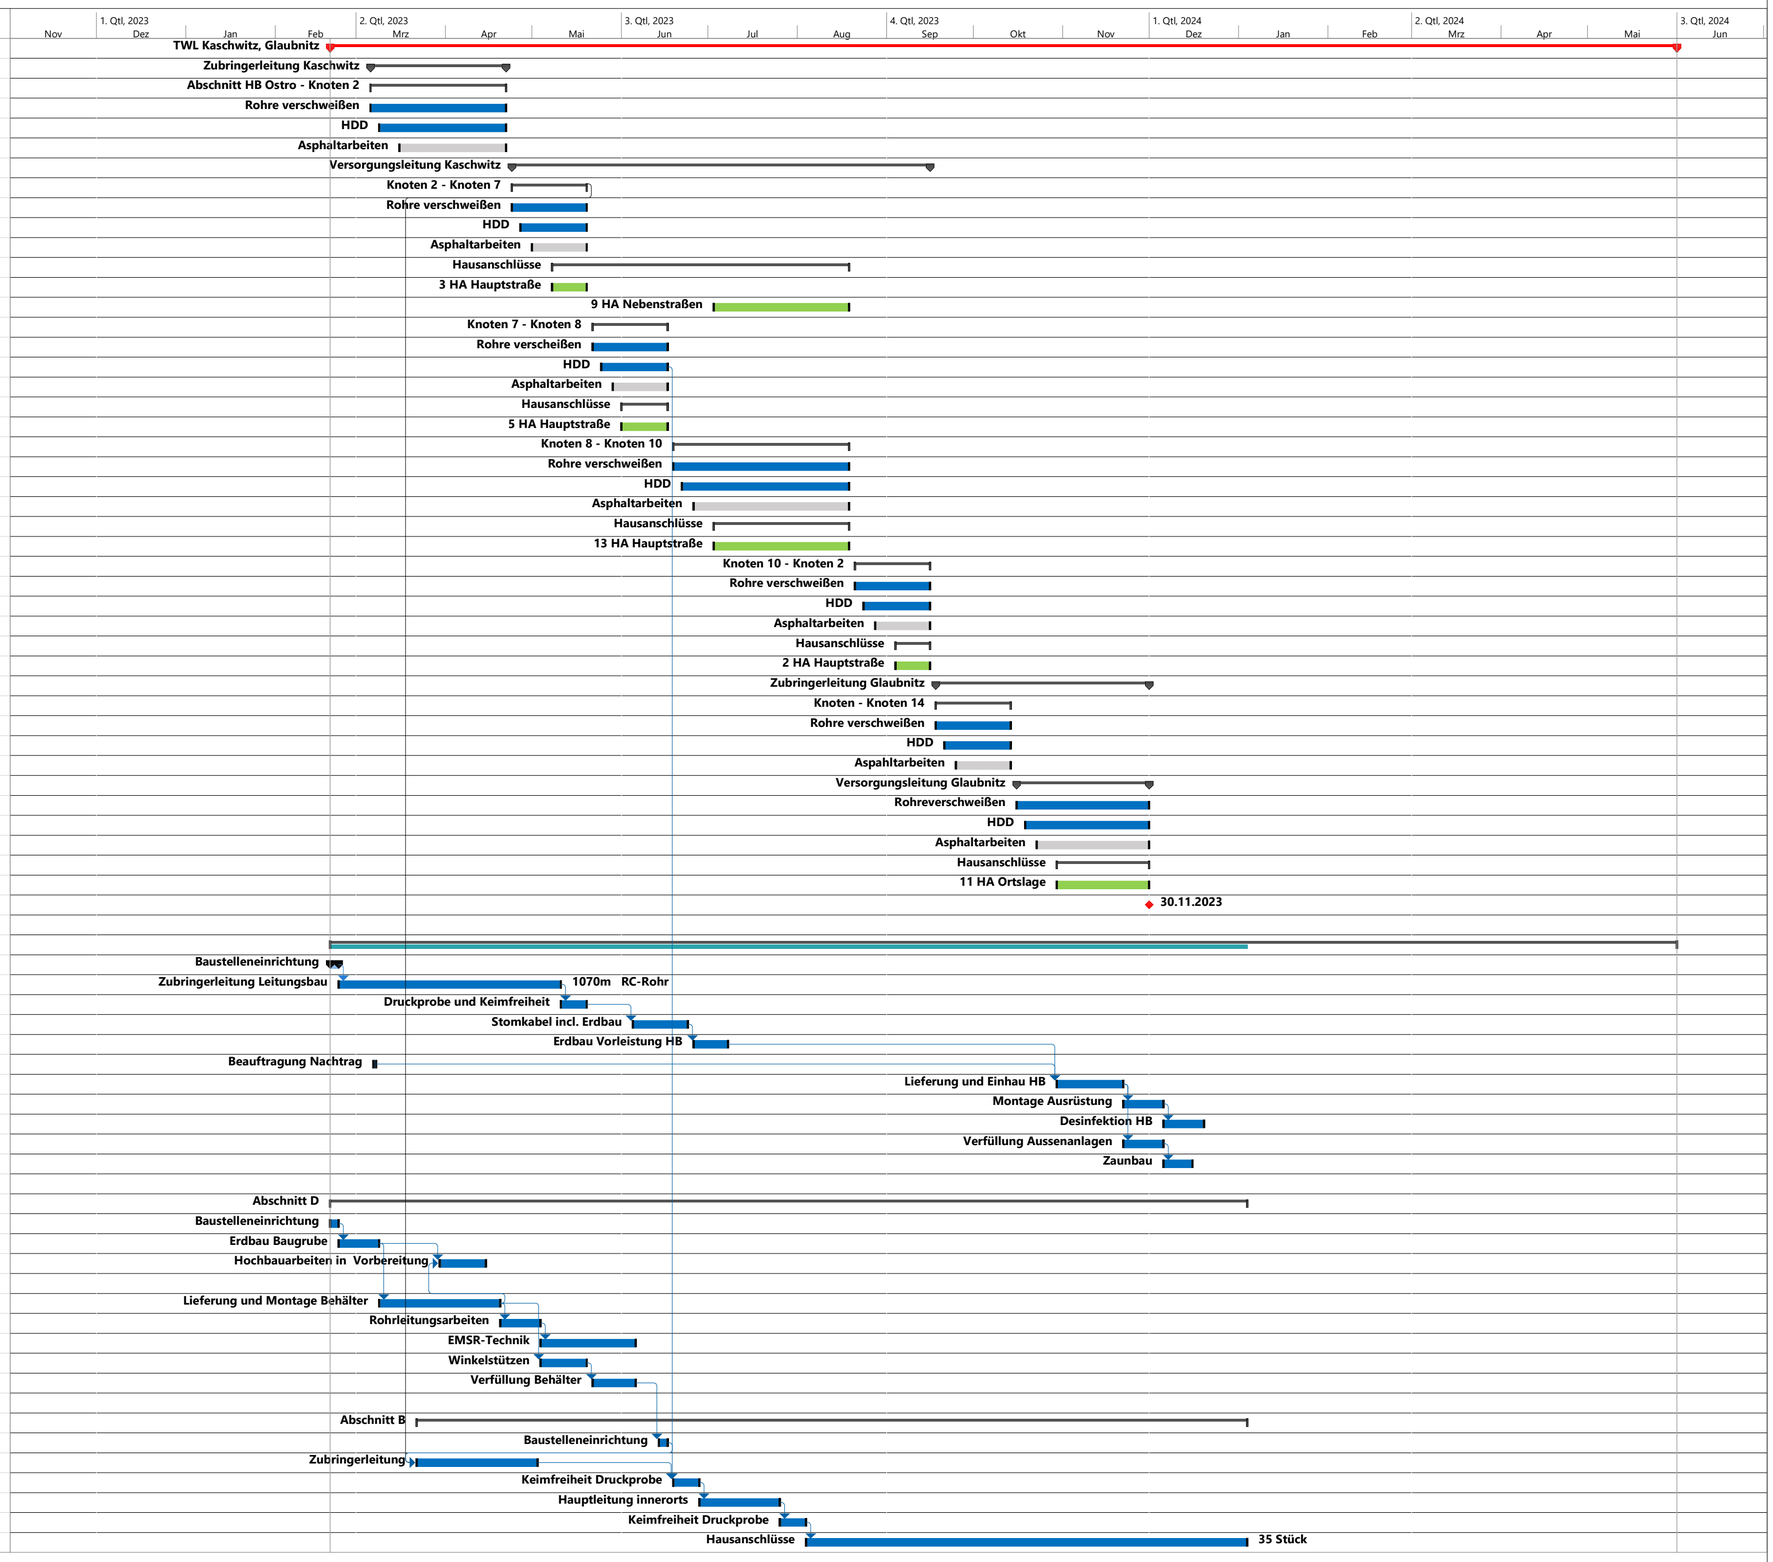
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
0	**TWL Kaschwitz, Glaubnitz**	**335 Tage**	**Mon 20.02.23**	**Fre 31.05.24**		
1	**Zubringerleitung Kaschwitz**	**35 Tage**	**Mon 06.03.23**	**Fre 21.04.23**		
2	**Abschnitt HB Ostro - Knoten 2**	**35 Tage**	**Mon 06.03.23**	**Fre 21.04.23**		
3	Rohre verschweißen	35 Tage	Mon 06.03.23	Fre 21.04.23		
4	HDD	32 Tage	Don 09.03.23	Fre 21.04.23		
5	Asphaltarbeiten	27 Tage	Don 16.03.23	Fre 21.04.23		
6	**Versorgungsleitung Kaschwitz**	**105 Tage**	**Mon 24.04.23**	**Fre 15.09.23**		
7	**Knoten 2 - Knoten 7**	**20 Tage**	**Mon 24.04.23**	**Fre 19.05.23**		
8	Rohre verschweißen	20 Tage	Mon 24.04.23	Fre 19.05.23		
9	HDD	17 Tage	Don 27.04.23	Fre 19.05.23		
10	Asphaltarbeiten	15 Tage	Mon 01.05.23	Fre 19.05.23		
11	**Hausanschlüsse**	**75 Tage**	**Mon 08.05.23**	**Fre 18.08.23**		
12	3 HA Hauptstraße	10 Tage	Mon 08.05.23	Fre 19.05.23		
13	9 HA Nebenstraßen	35 Tage	Mon 03.07.23	Fre 18.08.23		
14	**Knoten 7 - Knoten 8**	**20 Tage**	**Mon 22.05.23**	**Fre 16.06.23**		
15	Rohre verscheißen	20 Tage	Mon 22.05.23	Fre 16.06.23		
16	HDD	17 Tage	Don 25.05.23	Fre 16.06.23		
17	Asphaltarbeiten	15 Tage	Mon 29.05.23	Fre 16.06.23		
18	**Hausanschlüsse**	**12 Tage**	**Don 01.06.23**	**Fre 16.06.23**		
19	5 HA Hauptstraße	12 Tage	Don 01.06.23	Fre 16.06.23		
20	**Knoten 8 - Knoten 10**	**45 Tage**	**Mon 19.06.23**	**Fre 18.08.23**		
21	Rohre verschweißen	45 Tage	Mon 19.06.23	Fre 18.08.23		
22	HDD	42 Tage	Don 22.06.23	Fre 18.08.23		
23	Asphaltarbeiten	40 Tage	Mon 26.06.23	Fre 18.08.23		
24	**Hausanschlüsse**	**35 Tage**	**Mon 03.07.23**	**Fre 18.08.23**		
25	13 HA Hauptstraße	35 Tage	Mon 03.07.23	Fre 18.08.23		
26	**Knoten 10 - Knoten 2**	**20 Tage**	**Mon 21.08.23**	**Fre 15.09.23**		
27	Rohre verschweißen	20 Tage	Mon 21.08.23	Fre 15.09.23		
28	HDD	17 Tage	Don 24.08.23	Fre 15.09.23		
29	Asphaltarbeiten	15 Tage	Mon 28.08.23	Fre 15.09.23		
30	**Hausanschlüsse**	**10 Tage**	**Mon 04.09.23**	**Fre 15.09.23**		
31	2 HA Hauptstraße	10 Tage	Mon 04.09.23	Fre 15.09.23		
32	**Zubringerleitung Glaubnitz**	**54 Tage**	**Mon 18.09.23**	**Don 30.11.23**		
33	**Knoten - Knoten 14**	**20 Tage**	**Mon 18.09.23**	**Fre 13.10.23**		
34	Rohre verschweißen	20 Tage	Mon 18.09.23	Fre 13.10.23		
35	HDD	17 Tage	Don 21.09.23	Fre 13.10.23		
36	Aspahltarbeiten	15 Tage	Mon 25.09.23	Fre 13.10.23		
37	**Versorgungsleitung Glaubnitz**	**34 Tage**	**Mon 16.10.23**	**Don 30.11.23**		
38	Rohreverschweißen	34 Tage	Mon 16.10.23	Don 30.11.23		
39	HDD	31 Tage	Don 19.10.23	Don 30.11.23		
40	Asphaltarbeiten	29 Tage	Mon 23.10.23	Don 30.11.23		
41	**Hausanschlüsse**	**24 Tage**	**Mon 30.10.23**	**Don 30.11.23**		
42	11 HA Ortslage	24 Tage	Mon 30.10.23	Don 30.11.23		
43	**Fertigstellung**	1 Tag	Don 30.11.23	Don 30.11.23		
44						
45	**Abschnitt C**	**335 Tage**	**Mon 20.02.23**	**Fre 31.05.24**		
46	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Mon 20.02.23	Mit 22.02.23		
47	Zubringerleitung Leitungsbau	55 Tage	Don 23.02.23	Mit 10.05.23	46	1070m RC-Rohr
48	Druckprobe und Keimfreiheit	7 Tage	Don 11.05.23	Fre 19.05.23	47	
49	Stomkabel incl. Erdbau	15 Tage	Mon 05.06.23	Fre 23.06.23	48EA+10 Tage	
50	Erdbau Vorleistung HB	10 Tage	Mon 26.06.23	Fre 07.07.23	49	
51	Beauftragung Nachtrag	1 Tag?	Die 07.03.23	Die 07.03.23		
52	Lieferung und Einhau HB	17 Tage	Mon 30.10.23	Die 21.11.23	50;51EA+168 Tage	
53	Montage Ausrüstung	10 Tage	Mit 22.11.23	Die 05.12.23	52	
54	Desinfektion HB	10 Tage	Mit 06.12.23	Die 19.12.23	53	
55	Verfüllung Aussenanlagen	10 Tage	Mit 22.11.23	Die 05.12.23	52	
56	Zaunbau	8 Tage	Mit 06.12.23	Fre 15.12.23	55	
57						
58	**Abschnitt D**	**228 Tage**	**Mon 20.02.23**	**Mit 03.01.24**		
59	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Mon 20.02.23	Mit 22.02.23		
60	Erdbau Baugrube	10 Tage	Don 23.02.23	Mit 08.03.23	59	
61	Hochbauarbeiten in Vorbereitung	12 Tage	Don 30.03.23	Fre 14.04.23	60EA+5 Tage;63	
62						
63	Lieferung und Montage Behälter	30 Tage	Don 09.03.23	Mit 19.04.23	60	
64	Rohrleitungsarbeiten	10 Tage	Don 20.04.23	Mit 03.05.23	63	
65	EMSR-Technik	23 Tage	Don 04.05.23	Mon 05.06.23	64	
66	Winkelstützen	12 Tage	Don 04.05.23	Fre 19.05.23	63	
67	Verfüllung Behälter	11 Tage	Mon 22.05.23	Mon 05.06.23	66	
68						
69	**Abschnitt B**	**206 Tage**	**Mit 22.03.23**	**Mit 03.01.24**		
70	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Mit 14.06.23	Fre 16.06.23	67	
71	Zubringerleitung	30 Tage	Mit 22.03.23	Die 02.05.23	70;7	
72	Keimfreiheit Druckprobe	7 Tage	Mon 19.06.23	Die 27.06.23	71;16	
73	Hauptleitung innerorts	20 Tage	Mit 28.06.23	Die 25.07.23	72	
74	Keimfreiheit Druckprobe	7 Tage	Mit 26.07.23	Don 03.08.23	73	
75	Hausanschlüsse	109 Tage	Fre 04.08.23	Mit 03.01.24	74	35 Stück
